مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

وزارة الإسكان
MINISTRY OF HOUSING

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

Works Inspection Request - WIR | طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	طلب تسليم كور اسفلت طبقة سطحية	الرقم التسلسلي: 0000
Date	٢٠٢٥/١٠/٠٧	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor: | الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) | المرفقات

- ■ Sketch attached to show the location(s) / كروكي توضيحي للموقع
- ☐ Approved Shop Drawing / الرسومات التنفيذية المعتمدة
- ☐ Inspection Check list / قائمة الفحص
- ☐ Test Reports (if any) / تقارير إختبارات (إن وجدت)
- ☐ Surveyor Field Sheet (if any) / سجل إستلام الأعمال المساحية
- ☐ Ohters(state) / أخرى

Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء	☐ Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested: | وصف الأعمال المطلوب تسليمها

كوراسفلت/ طبقة ثانية
شارع رقم 04
بلوك 03

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه تم تنفيذها حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي	Date: 07/10/2025 التاريخ:

شركة طرق الرياض للمقاولات (1010204003) مخطط تلال الغروب - جدة بلوكات رقم (١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠) RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

Part B: By the Consultant: | الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: | ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الإسم: شاهين محمد	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any): | نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

- ☑ Passed مقبول
- ☐ Failed مرفوض
- ☐ N/A لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision: | ملاحظات مدير المشروع - استشاري

☑ Approved يعتمد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض

Name: الاسم: م/ فوزي عبدالله المالكي	Signature التوقيع:	Date: التاريخ:

مكتب رمك للاستشارات الهندسية - مشاريع البنية التحتية


Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.
إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد




٢٠٢٥/١٠/٠٧ ٨:١٧:٠٩ ص
4903 Khames Al Khoulafa
الامير فواز الجنوبي
جدة
مكة المكرمة
#صلى على محمد



٢٠٢٥/١٠/٠٧ ٨:٠٩:١٣ ص
5064 خامس الخلفاء الفرعي
الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة
#صلى على محمد

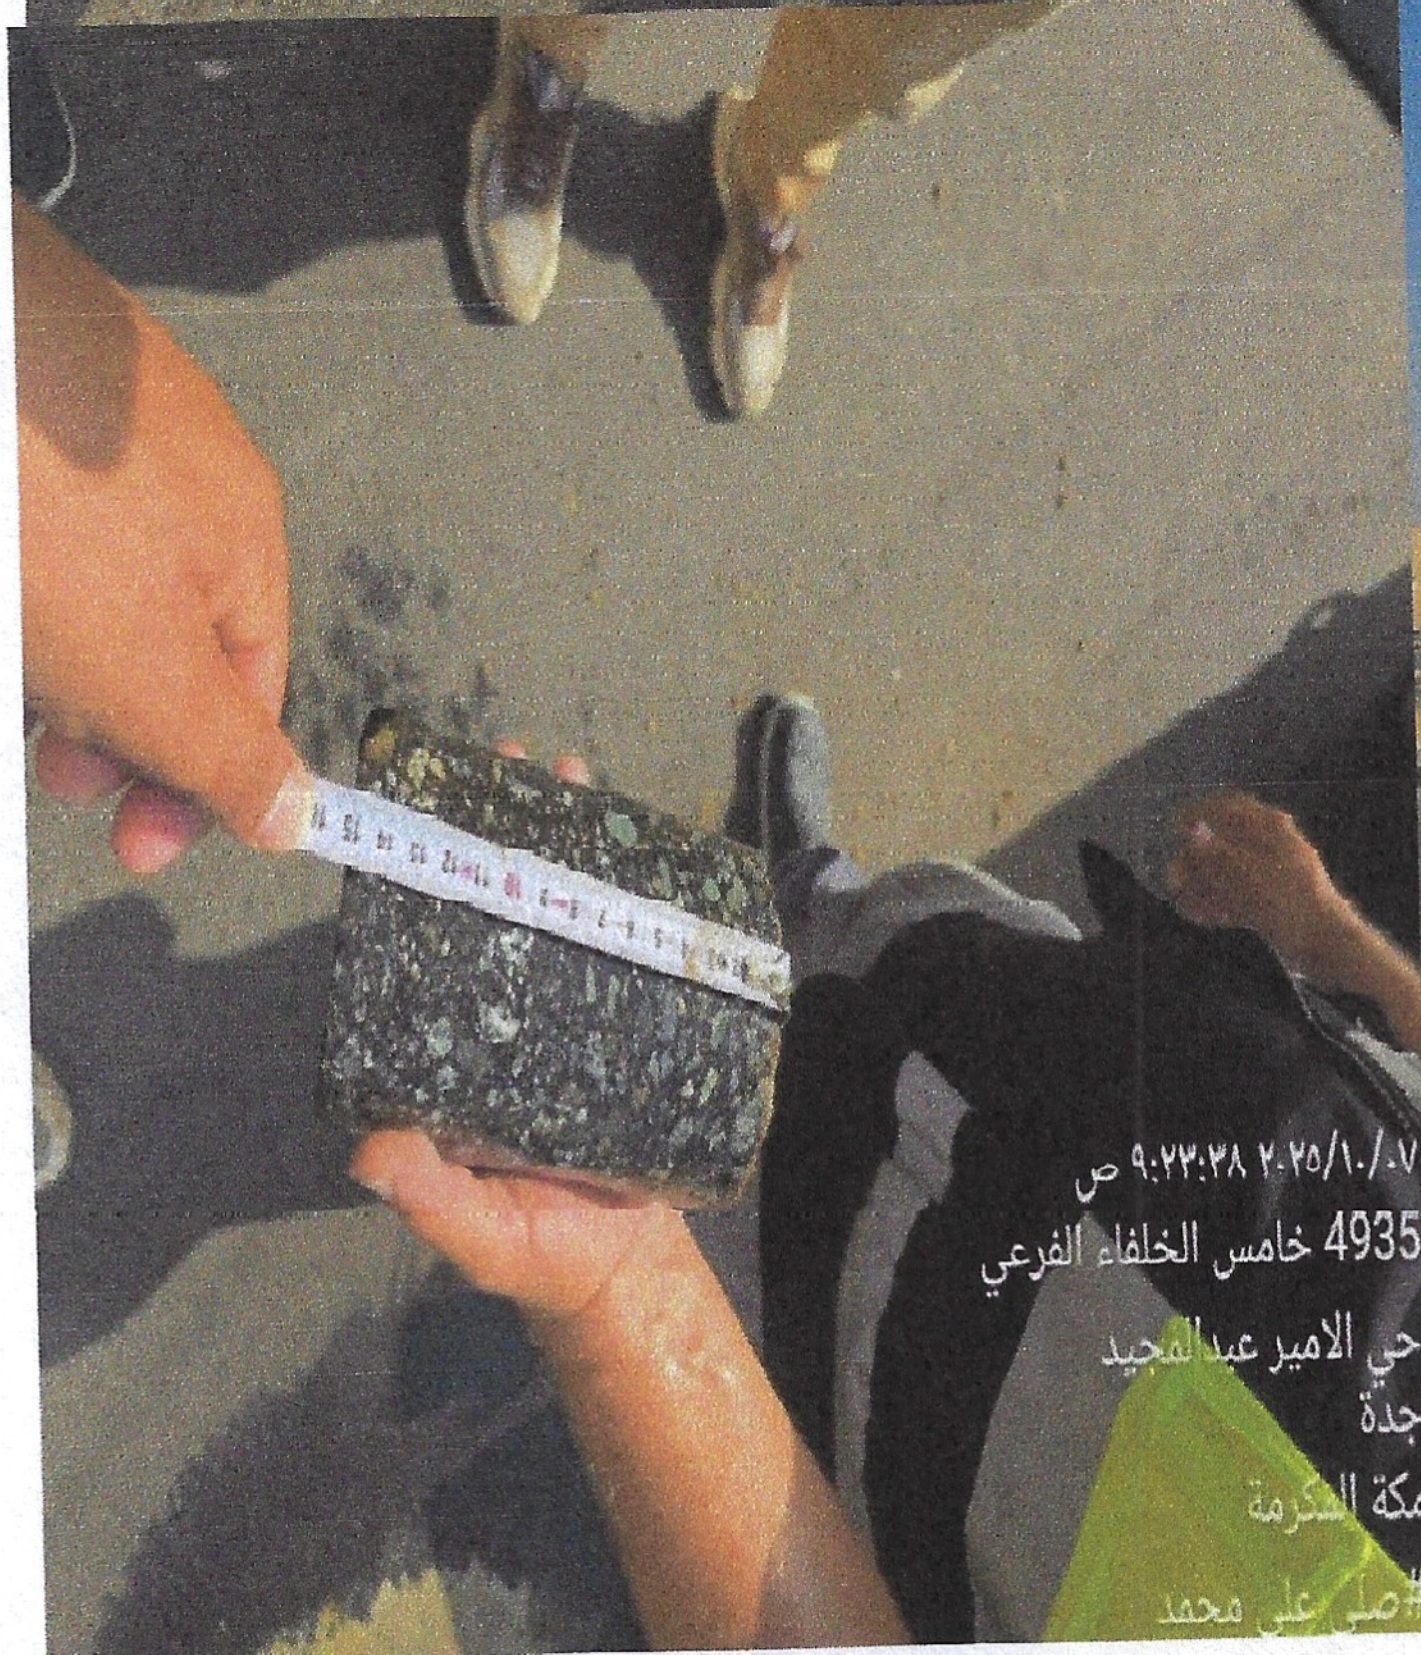

٢٠٢٥/١٠/٠٧ ٩:٢٣:٣٨ ص
4935 خامس الخلفاء الفرعي
حي الامير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة
#صلى على محمد

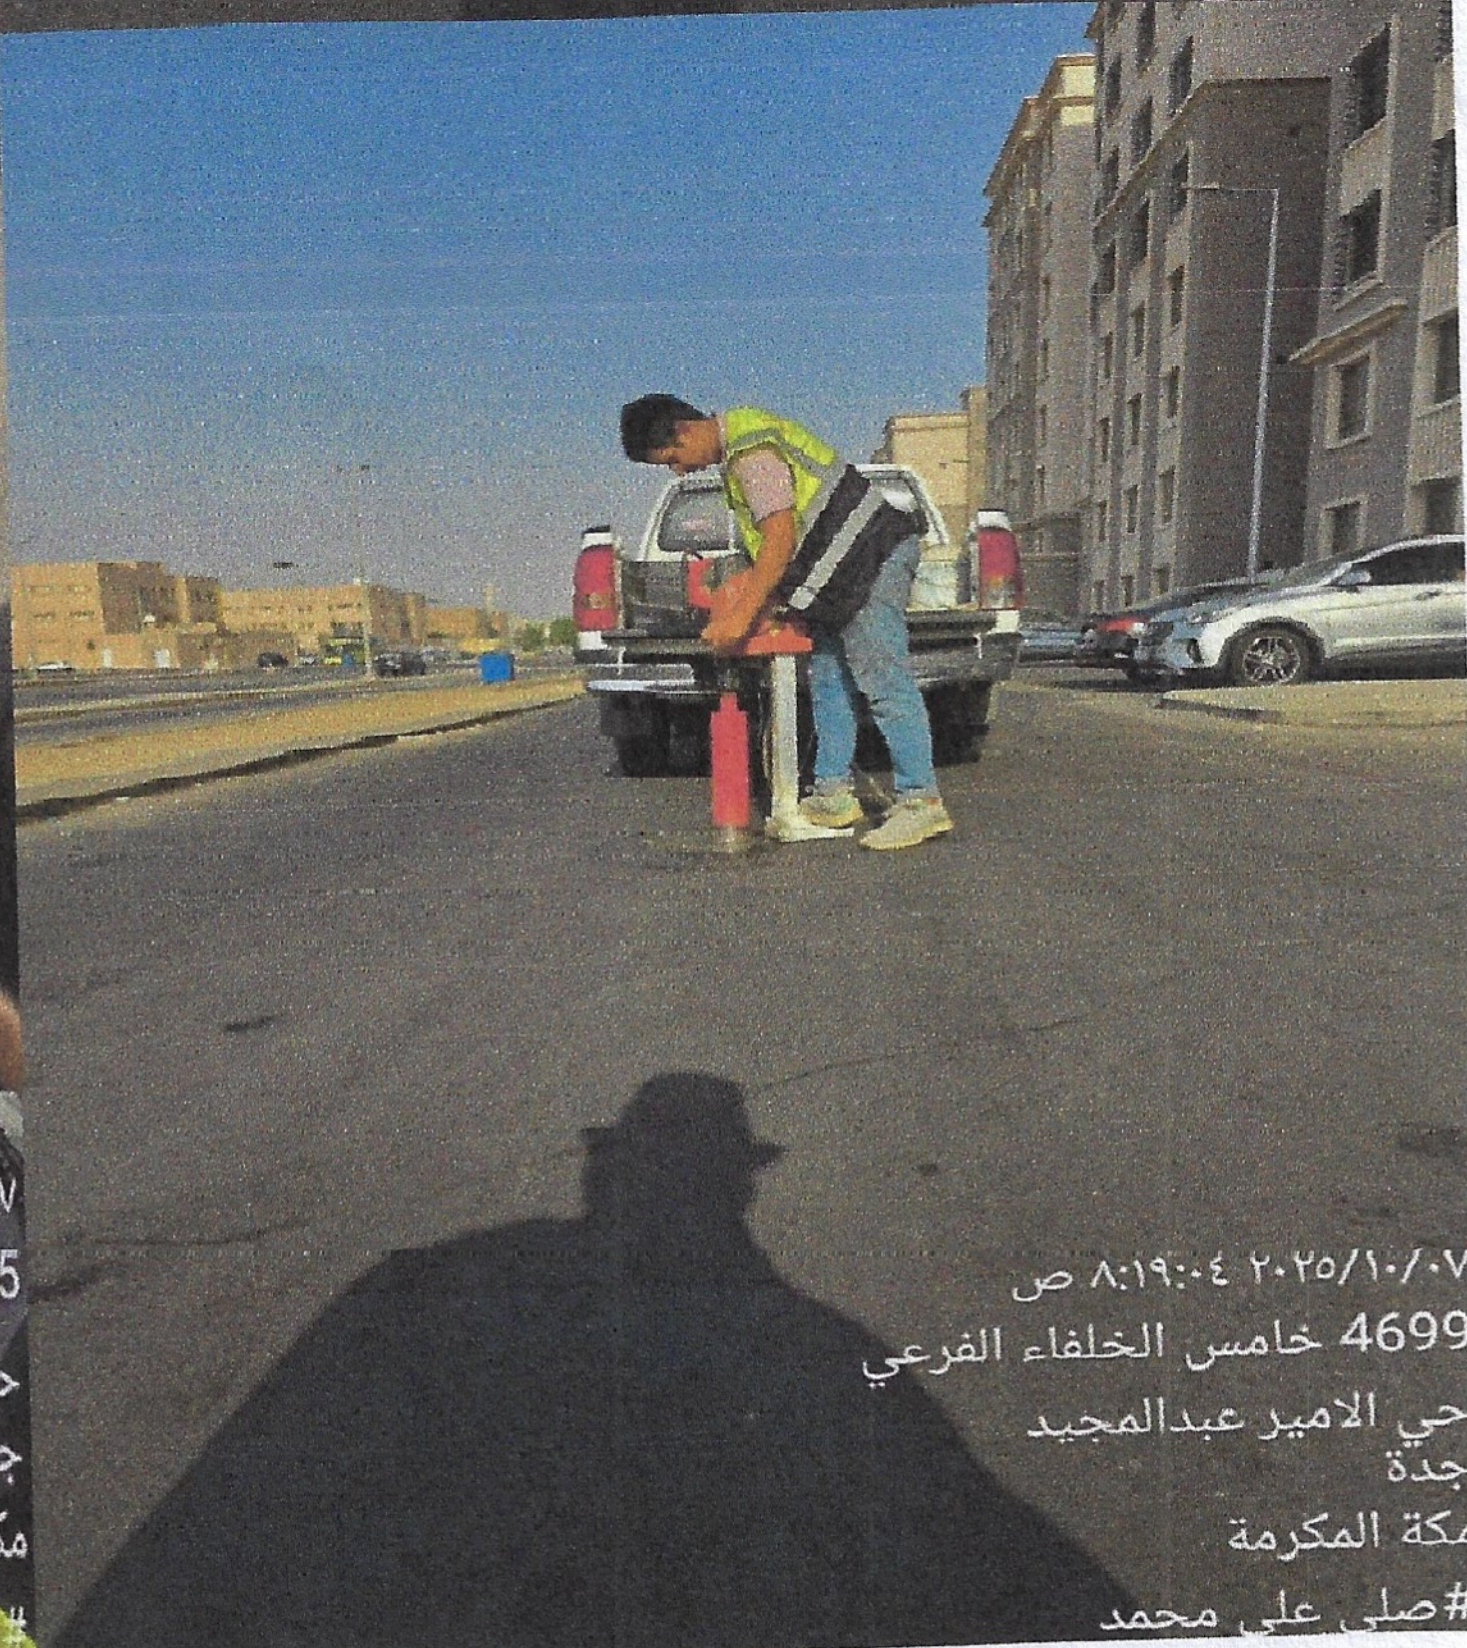

٢٠٢٥/١٠/٠٧ ٨:١٩:٠٤ ص
4699 خامس الخلفاء الفرعي
حي الامير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة
#صلى على محمد

ProLab
Proficiency Laboratory for technical consultations

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report No.	PRO-240463.128
Project	مشروع البنية التحتية - مخطط تلال الغروب	Test Date	7-10-2025
Location	جدة - حي الامير فواز	Report Date	8-10-2025
Location / Station	Block 03 - Road 04	Sample By	Ahmed / Sumon
Description:	BITUMINOUS WEARING COURSE LAYER (BWC Superpave)	Tested By	Saddam

ASPHALT CORES

Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. in Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm³)	Gmb (g/cm³)	Gmm (g/cm³)	Compaction (%)	Required Compaction (%)
1	Sta. (0+00 to 0+240.92)	5.6	871.6	507.3	873.2	365.9	2.382	2.589	92.0	
2	Sta. (0+00 to 0+240.92)	7.4	1207.4	703.5	1208.9	505.4	2.389	2.589	92.3	
	Average Thick.CM	6.5					Average Comp.		92.1	

ProLab — Proficiency Laboratory for technical consultations ★ Soil, Concrete, Asphalt, Materials ★ CR: 4030391463

BLOCK 3


BLOCK 3

St. B03-1 RO-B03-1 RO-B03-2 St. B03-3 RO-B03-3 St. B03-4 PED-B03-1A PED-B03-1B PED-B03-2 PED-B03-3

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

PLOT AREA = 62,293 m2
TOTAL BUILTUP AREA = 162,822 m2

FAR = 2.61
557 PARKING SPACES
528 UNITS

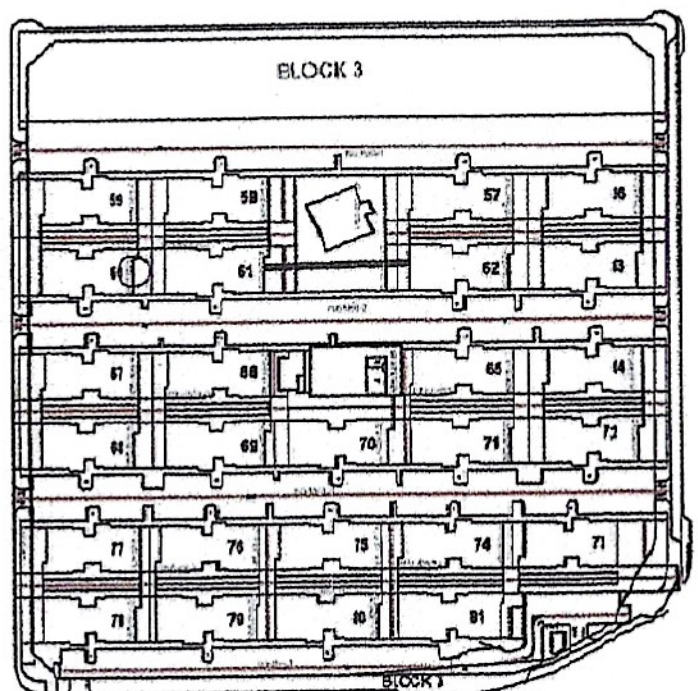

اتجاه تصريف المياه
الارض الطبيعية
الخط التصميمي
اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والانارة
ادارة التصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة ساس العامرية

الاستشاري العام/ الابنية للاستشارات الهندسية

الاستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحى الامير فواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

NO. 3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:350	مقياس الرسم:

مديرعام الدراسات والتصاميم — مديرادارة تصميم الطرق
